

1st International College Tournament of UOM

Διοργάνωση Τουρνουά Σκακιού

Baseline Report

Συγγραφική Ομάδα:	Πολύζος Βασίλης, Γιαννουλάκος Βασίλης, Μηλίκος Βαγγέλης, Πολυμέρας Βαγγέλης, Σαμαράς Παναγιώτης
Υπεύθυνος:	Βασίλης Πολύζος
Έκδοση:	5η
Ημερομηνία:	13/01/2025
Τύπος παραδοτέου:	Έγγραφο PDF (Ψηφιακή Μορφή)

Ομάδα Έργου

	Ρόλος	*Όνομα*
1.	Project Manager	Πολύζος Βασίλης
2.	Financial Manager	Γιαννουλάκος Βασίλης
3.	Quality Manager	Μηλίκος Βαγγέλης
4.	Communication & Draws Manager	Πολυμεράς Βαγγέλης
5.	Marketing & Live Games Manager	Σαμαράς Παναγιώτης

Ιστορικό Αναθεώρησης

Έκδοση	*Ημερομηνία*	*Υπεύθυνος*	*Περιγραφή*
1η	29/11/2024	Βασίλης Πολύζος	Αρχική Έκδοση
2η	30/11/2024	Βασίλης Πολύζος	Διορθώσεις & προσθήκες στην Αρχική Έκδοση
3η	01/12/2024	Βασίλης Πολύζος	Διορθώσεις & προσθήκες στην 2η Έκδοση
4η	11/01/2025	Βασίλης Πολύζος	Διορθώσεις & προσθήκες στην 3η Έκδοση (Gantt Chart)
5η	13/01/2025	Βασίλης Πολύζος	Διορθώσεις & προσθήκες στην 4η Έκδοση (Οριστική Έκδοση)

Πίνακας Περιεχομένων

1 ΕΥΡΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ 5
2 PROJECT CHARTER 6
3 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 7
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 8
5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10
6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 11
7 ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WBS) 12
8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (OBS) 13
9 ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΩΝ 14
10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 15
11 ΛΙΣΤΑ ΠΟΡΩΝ (RESOURCES SHEET) 17
12 ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 18
13 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΠΟΡΟ, Δ ΚΑΙ ΠΕ 19
14 ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΠΟΡΟ, Δ ΚΑΙ ΠΕ 20
15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ) 21
16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22
17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 24
18 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΡΩΝ 25
19 ΑΤΟΜΙΚΑ TIMESHEETS 27
20 ΠΗΓΕΣ 30

Εύρος/αντικείμενο και στόχοι έργου

Περιγραφή Έργου:

Η διοργάνωση του τουρνουά σκακιού αφορά φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ιδρύματος ή εθνικότητας, με ηλικία έως 25 ετών (γεννημένοι από 01/01/2000 και μετά). Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του πανεπιστημίου, με σύστημα διεξαγωγής ελβετικό 7 γύρων και χρόνο σκέψης τουλάχιστον μίας ώρας ανά παίκτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του standard. Σκοπός της διοργάνωσης, πέρα από την προώθηση του σκακιού, είναι η συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό, συνδυάζοντας έτσι την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά.

Εύρος Έργου:

In Scope	
Παροχή πρώτων βοηθειών	Συμμόρφωση συμμετεχόντων με τους κανόνες
Συναλλαγές για απόκτηση εξοπλισμού	Live αναμετάδοση παρτίδων
Διαφήμιση και Προβολή	Δημιουργία σελίδας σε social media

Out of Scope
Εξήγηση Κανόνων Σκακιού
Μεταφορά και Διαμονή Συμμετεχόντων
Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος

Στόχοι Έργου:

Στόχοι Project	
Εξασφάλιση χώρου με ικανότητα φιλοξενίας 500 παικτών και απαραίτητου εξοπλισμού	14/02/2025
Προσέλκυση 200 συμμετεχόντων στο τουρνουά.	28/03/2025
Συγκέντρωση τουλάχιστον κέρδος ύψους 2000€ για τη δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα	15/04/2025

Project Charter

Project Charter (Χάρτης Έργου)			
Όνομα Project	**Ημερομηνία**	**Αντικείμενο Έργου**	
1st International College Chess Tournament of UOM	09-13/4/2025	Διοργάνωση event	
Περιγραφή Project	**Scope (Εύρος)**		
Διοργάνωση ενός τουρνουά σκακιού, που θα απευθύνεται σε άτομα που φοιτούν σε κάποιο πανεπιστήμιο, κολλέγιο ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι το πολύ 25 ετών, δηλαδή γεννημένα από 01/01/2000 και μετά. Τα άτομα αυτά μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, καθώς και οποιουδήποτε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάποιας χώρας. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο γήπεδο του πανεπιστημίου. Το σύστημα διεξαγωγής του θα είναι ελβετικό 7 γύρων με χρόνο σκέψης που θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του standard (τουλάχιστον μία ώρα για κάθε παίκτη). Τα χρήματα που θα μαζευτούν από το event θα δοθούν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα.	**In Scope**		**Out of Scope**
	Παροχή πρώτων βοηθειών	Συμμόρφωση συμμετεχόντων με τους κανόνες	Εξήγηση Κανόνων Σκακιού
	Συναλλαγές για απόκτηση εξοπλισμού	Live αναμετάδοση παρτίδων	Μεταφορά και Διαμονή Συμμετεχόντων
	Διαφήμιση και Προβολή	Δημιουργία σελίδας σε social media	Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος
	Key Deliverables (Κύρια Παραδοτέα)		
	Χρονοδιάγραμμα Τουρνουά	Λίστα Ομάδας Έργου	
	Οριστικοποιημένο Budget	Δελτίο Τύπου	
	Προκήρυξη	Δελτίο Παραλαβής και Εγκατάστασης Υλικού Εξοπλισμού	
	Λίστα Συμμετεχόντων		
	Διαιτητές		

Στόχοι Project	
Εξασφάλιση χώρου με ικανότητα φιλοξενίας 500 παικτών και απαραίτητου εξοπλισμού	14/02/2025
Προσέλκυση 200 συμμετεχόντων στο τουρνουά.	28/03/2025
Συγκέντρωση τουλάχιστον κέρδος ύψους 2000€ για τη δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα	15/04/2025

Μέλη Ομάδας	
Όνομα	**Αρμοδιότητα**
Βασίλης Πολύζος	Project Manager
Παναγιώτης Σαμαράς	Marketing and Live Games Manager
Βασίλης Γιαννουλάκος	Financial Manager
Βαγγέλης Μηλίκος	Quality Manager
Βαγγέλης Πολυμεράς	Communications and Draws Manager

Timeline (Χρονοδιάγραμμα)	
Action (Ενέργειες) / Milestones (Ορόσημα)	**Target Date**
Κάλυψη Χορηγιών	07/02/2025
Οριστικοποίηση χώρου	14/02/2025
Εξασφάλιση υλικού εξοπλισμού	19/02/2025
Έναρξη της καμπάνιας προβολής (social media, αφίσες, δελτία τύπου).	20/02/2025
Περίοδος αξιολόγησης διαιτητών	20/03/2025
Ορισμός Διαιτητών	28/03/2025
Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	08/04/2025
Έναρξη τουρνουά	09/04/2025
Απονομή βραβείων	13/04/2025
Πραγματοποίηση δωρεάς χρημάτων σε φιλανθρωπικό ίδρυμα	15/04/2025
Ανάρτηση δελτίου τύπου σε ΜΜΕ (ενόψει της ολοκλήρωσης του τουρνουά)	16/04/2025

Υποθέσεις / Περιορισμοί
Έγκριση και παραχώρηση του γηπέδου για την διεξαγωγή του τουρνουά (ΠΑΜΑΚ)
Συμμετοχές φοιτητών (Ηλικίας το πολύ 25 ετών)
Χορηγίες τουλάχιστον 1000€

Κοινωνικός Αντίκτυπος
Προώθηση του σκακιού ως δραστηριότητας σκέψης και στρατηγικής.
Συγκέντρωση πόρων για τον φιλανθρωπικό σκοπό.

Κίνδυνοι Έργου
Να μην συμπληρωθεί ο απιτούμενος αριθμός ατόμων για την διεξαγωγή του event
Να μην συγκεντρωθούν έσοδα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα

Πλάνο Επικοινωνίας Έργου

Όνομα Project:	**Διοργάνωση Τουρνουά Σκακιού**
Project Manager:	**Βασίλης Πολύζος**
Κύριος Εντολέας (Sponsor):	**ΠΑΜΑΚ**
Κύριο Ενδιαφερόμενο Μέρος:	**SKG Chess Club**
Ημερομηνία:	**9-13/04/2025**

Πληροφορίες Παραδοτέων (Τι)	Αποδέκτες (Ποιος)	Μέθοδος Παράδοσης (Πώς)	Χρονοδιάγραμμα (Πότε)	Υπεύθυνος (Ιδιοκτήτης)
Ατζέντα / Πίνακας Δράσης	Ομάδα Έργου	Email, Team Meetings	Μηνιαία	Project Manager
Πληροφορίες Τουρνουά	Ομάδα Έργου, Κύριο Ενδιαφερόμενο Μέρος, Χορηγοί, Συμμετέχοντες	Προκήρυξη, Email, Social Media	Συναντήσεις 1-3	Project Manager
Αναφορά Εκτίμησης Κινδύνου	Ομάδα Έργου, Κύριο Ενδιαφερόμενο Μέρος, Χορηγοί	Email	Μετά την 4η συνάντηση	Quality Manager
Οριστικοποιημένος Προϋπολογισμός	Κύριος Εντολέας, Κύριο Ενδιαφερόμενο Μέρος, Χορηγοί, Ομάδα Έργου	Email, Έντυπη Μορφή (Έγγραφο PDF)	Μετά την οριστική λήψη οικονομικών εισροών	Financial Manager
Διαφημιστική Καμπάνια	Υποψήφιοι συμμετέχοντες	Email, Social Media, Φυλλάδια, Αφίσες	28/02/2025	Marketing and Live Games Manager
Λίστα Συμμετεχόντων	Ομάδα Έργου, Υποψήφιοι Συμμετέχοντες	Ηλεκτρονική Μορφή, Έντυπη Μορφή	Μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής	Communications and Draws Manager
Live Streaming	Θεατές	Σύστημα Ζωντανής Μετάδοσης	Κατά τη διάρκεια των αγώνων	Marketing and Live Games Manager
Ενημερώσεις Σκορ και Κληρωσεων	Συμμετέχοντες, Ομάδα Έργου	Δημοσιεύσεις (Social Media)	Κατά τη διάρκεια των αγώνων	Communications and Draws Manager
Δελτίο Τύπου	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ηλεκτρονικός και Έντυπος Τύπος)	Social Media, Email, Εφημερίδες	Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά και της δωρεάς	Communications and Draws Manager

Πρόγραμμα Συναντήσεων Έργου (1ο Μέρος)

Πρόγραμμα Συνάντησης για τη Διοργάνωση Τουρνουά Σκακιού

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: 11/11/2024, ώρα 7:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Trello

Στόχοι Συνάντησης:
- Επιβεβαίωση WBS
- Επιλογή κατάλληλου OBS

Agenda:
- Παρουσίαση νέου WBS μετά την προσθήκη του Work Package 0 από τον Γιαννουλάκο
- Συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο WBS και τελική επιβεβαίωση
- Παρουσίαση λειτουργίας και πλεονεκτημάτων ενός Λειτουργικού (Functional) OBS από τον Μηλίκο
- Παρουσίαση λειτουργίας και πλεονεκτημάτων ενός Project - oriented OBS από τον Πολυμερά
- Παρουσίαση λειτουργίας και πλεονεκτημάτων Οργανωτικής Δομής τύπου Matrix (Matrix OBS) από τον Σαμαρά
- Ψηφοφορία για την επιλογή του κατάλληλου OBS
- Συζήτηση για την δημιουργία του OBS της επιλεγμένης οργανωτικής δομής

Αποτελέσματα Συνάντησης:
- Ολοκλήρωση δημιουργίας WBS
- Επιλογή Λειτουργικής Οργανωτικής Δομής (Functional OBS) για την Οργάνωση του Έργου και προσδιορισμός διοικητικών διευθύνσεων

Action List:

Ενέργεια	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Δημιουργία OBS	Πολύζος	20/11/2024
Έρευνα για πίνακα RAM	Μηλίκος	20/11/1024
Έρευνα για Διάγραμμα RACI	Γιαννουλάκος	20/11/2024
Συμπλήρωση των Work Packages και των Tasks στο MS Project	Σαμαράς	20/11/2024
Δημιουργία Πλάνου Επικοινωνίας	Πολυμεράς	20/11/2024

Ημερομηνία και Ώρα Επόμενης Συνάντησης: 18/11/2024, ώρα 7:00 μ.μ.

Πρόγραμμα Συναντήσεων Έργου (2ο Μέρος)

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: 20/12/2024, ώρα 7:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Trello

Στόχοι Συνάντησης:
- Υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών στο Interim Baseline Report
- Ανάθεση των υπολειπόμενων ζητουμένων στα μέλη της ομάδας

Agenda:
- Αναφορά των λαθών του Interim Report που πρέπει να διορθωθούν
- Συζήτηση για διορθωτικές ενέργειες
- Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών στο WBS
- Συζήτηση να την ανάληψη των υπολειπόμενων ζητημάτων

Αποτελέσματα Συνάντησης:
- Επίλυση όλων των λαθών που βρέθηκαν
- Ανάθεση όλων των υπόλοιπων ζητημάτων στα μέλη της ομάδας


Action List:

Ενέργεια	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Δημιουργία αναφοράς με προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τη διαδικασία επίλυσής τους	Πολύζος	8/1/2025
Δημιουργία Risk Management Plan	Μηλίκος	8/1/1025
Επίλυση ανεπάρκειας πόρων μέσω εξομάλυνση πόρων	Γιαννουλάκος	8/11/2025
Δημιουργία Φόρμας με προτεινόμενες αλλαγές	Σαμαράς	8/1/2025
Δημιουργία Risk Management Plan	Πολυμεράς	8/1/2025


Ημερομηνία και Ώρα Επόμενης Συνάντησης: 8/1/2024, ώρα 7:00 μ.μ.

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας


- **Discord** (Διαδικτυακές Συναντήσεις προκειμένου να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις)
- **Microsoft Office Project** (Διάγραμμα Gantt, Resource Sheet)
- **draw.io** (Online εργαλείο για την δημιουργία διαγραμμάτων OBS και WBS)
- **Trello** (Online Εργαλείο για την ανάθεση εργασιών και για την λίστα TODO)
- **Google Docs & Google Sheets** (Online Εργαλείο για την δημιουργία και την κοινή χρήση εγγράφων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το Project Charter, τα διαγραμμάτων και γενικότερα την καταγραφή ιδεών)

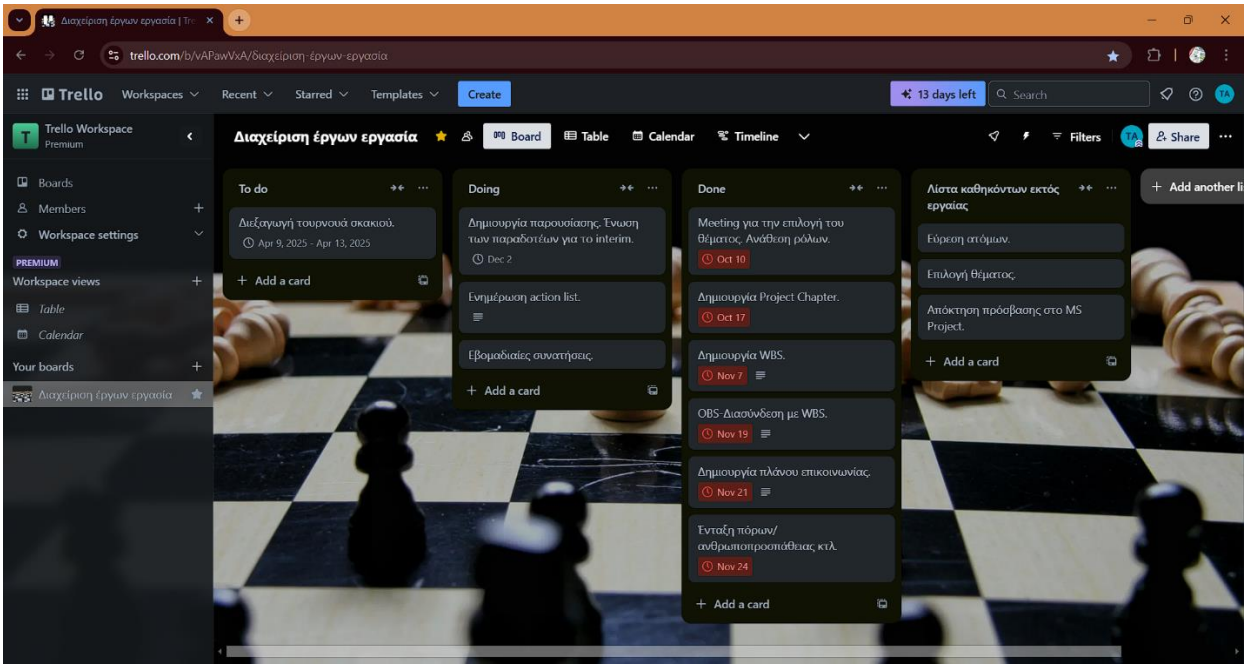


Διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός Ομάδας

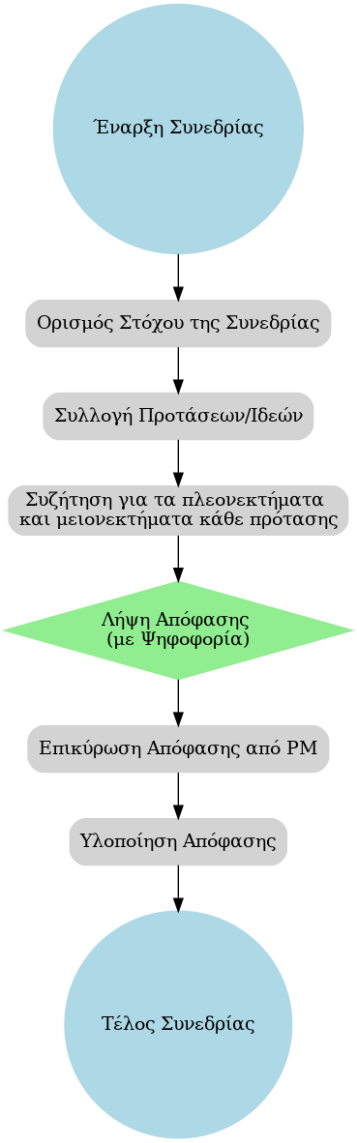

Δομή Ανάλυσης Εργασιών (WBS)

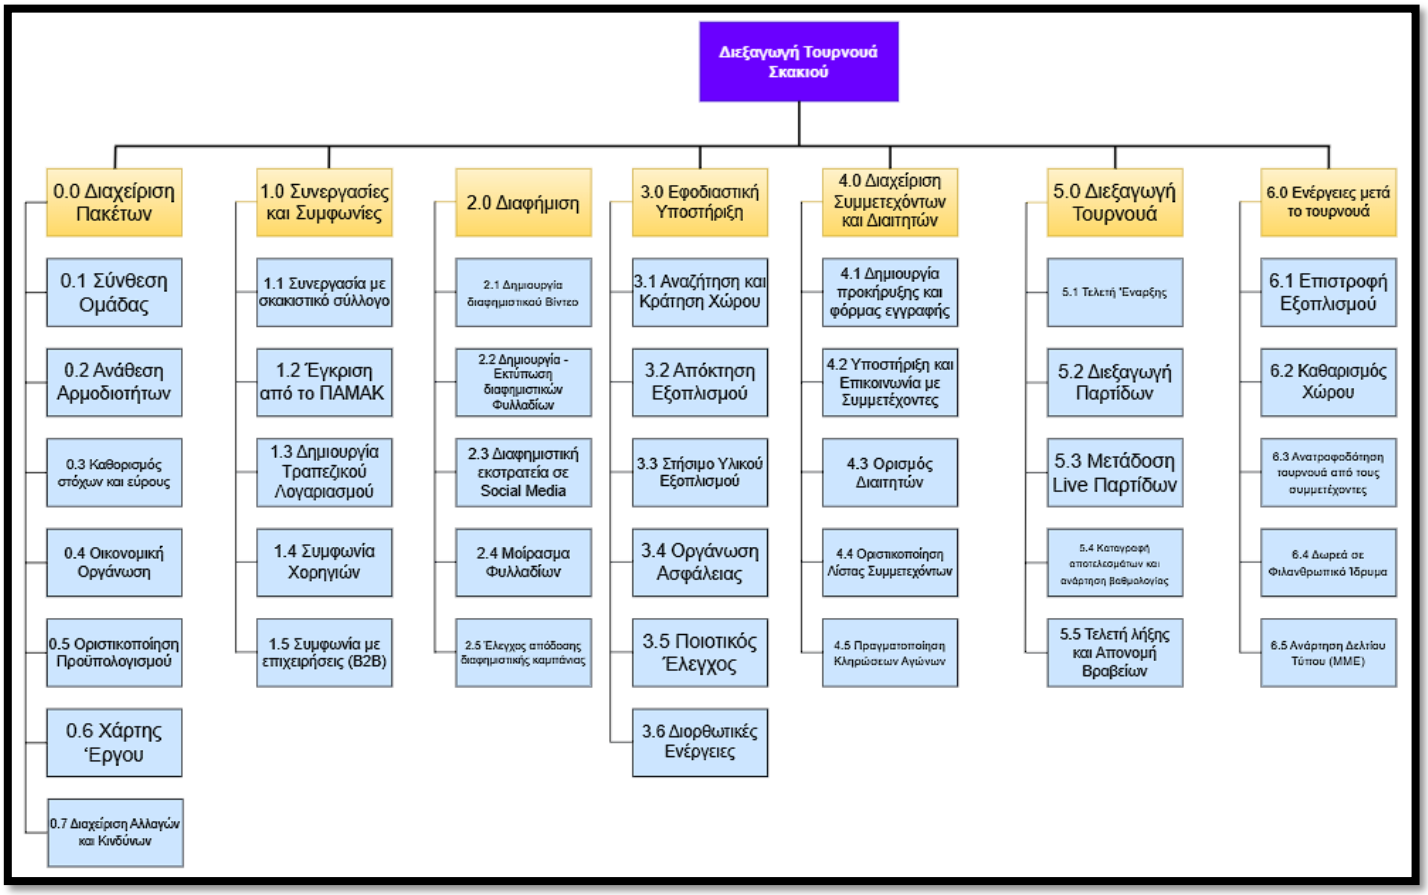

Οργανωτική Δομή (OBS)

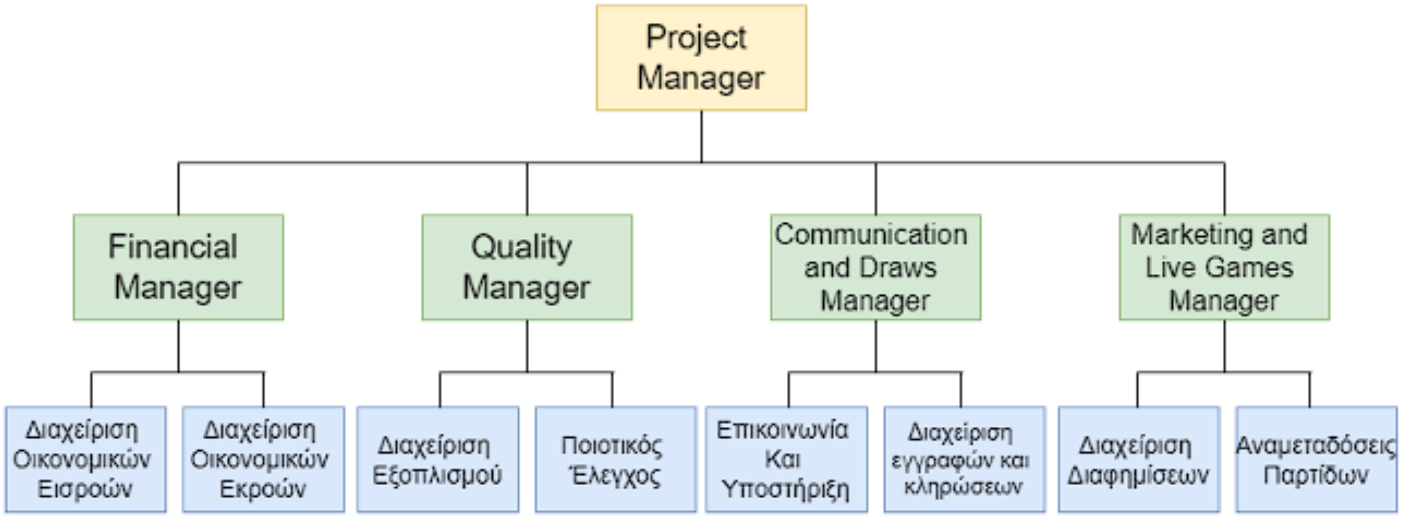

Λίστα Παραδοτέων και Οροσήμων

Λίστα Παραδοτέων και Οροσήμων ανά ΠΕ					
Κωδικός	**Όνομα ΠΕ**	**Τίτλος**	**Υπεύθυνος**	**Ημ/νία Παράδοσης**	**Εμπιστευτικό**
Key Deliverables (Κύρια Παραδοτέα)					
D.0.1	Διαχείριση Πακέτων Εργασίας	Λίστα Ομάδας Έργου	Project Manager	29/11/2024	ΟΧΙ
D.0.2	Διαχείριση Πακέτων Εργασίας	Οριστικοποιημένο Budget	Financial Manager	07/02/2025	ΝΑΙ
D.3.1	Εφοδιαστική Υποστήριξη	Δελτίο Παραλαβής και Εγκατάστασης Υλικού Εξοπλισμού	Quality Manager	08/04/2025	ΝΑΙ
D.4.1	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Προκήρυξη	Communication & Draws Manager	28/02/2025	ΟΧΙ
D.4.2	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Λίστα Συμμετεχόντων	Communication & Draws Manager	08/04/2025	ΝΑΙ
D.4.3	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Λίστα Διαϊτητών	Communication & Draws Manager	28/03/2025	ΝΑΙ
D.4.4	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Χρονοδιάγραμμα Τουρνουά	Project Manager	28/02/2025	ΟΧΙ
D.6.1	Ενέργειες μετά το τουρνουά	Δελτίο Τύπου	Marketing & Live Games Manager	16/04/2025	ΟΧΙ

Milestones (Ορόσημα)				
M.1.1	Συνεργασίες και Συμφωνίες	Κάλυψη Χορηγιών	Financial Manager	07/02/2025
M.2.2	Διαφήμιση	Έναρξη της καμπάνιας προβολής (social media, αφίσες, δελτία τύπου).	Marketing & Live Games Manager	20/02/2025
M.3.1	Εφοδιαστική Υποστήριξη	Οριστικοποίηση χώρου	Quality Manager	14/02/2025
M.3.2	Εφοδιαστική Υποστήριξη	Εξασφάλιση υλικού εξοπλισμού	Quality Manager	19/02/2025
M.4.1	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Περίοδος αξιολόγησης διαιτητών	Quality Manager	20/03/2025
M.4.2	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Ορισμός Διαιτητών	Communication & Draws Manager	28/03/2025
M.4.3	Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	Communication & Draws Manager	08/04/2025
M.5.1	Διεξαγωγή Τουρνουά	Έναρξη τουρνουά	Project Manager	09/04/2025
M.5.2	Διεξαγωγή Τουρνουά	Απονομή βραβείων	Project Manager	13/04/2025
M.6.1	Ενέργειες μετά το τουρνουά	Πραγματοποίηση δωρεάς χρημάτων σε φιλανθρωπικό ίδρυμα	Project Manager	15/04/2025
M.6.2	Ενέργειες μετά το τουρνουά	Ανάρτηση δελτίου τύπου σε ΜΜΕ (ενόψει της ολοκλήρωσης του τουρνουά)	Marketing & Live Games Manager	16/04/2025


Διάγραμμα Gantt

Entry Task Table:


	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Start	0 days	Tue 7/1/25	Tue 7/1/25		
2	**Συμφωνίες και Συνεργασίες**	**37 days**	**Tue 7/1/25**	**Wed 26/2/25**	**1**	
3	Συνεγασία με σκακιστικό σύλλογο	4 days	Tue 7/1/25	Fri 10/1/25	1	Communication and Draws Manager
4	Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	2 days	Mon 13/1/25	Tue 14/1/25	3	Financial Manager
5	Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	0,1 mons	Wed 15/1/25	Thu 16/1/25	4	Financial Manager
6	Συμφωνία Χορηγιών	8 days	Mon 10/2/25	Wed 19/2/25	5	Financial Manager
7	Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Marketing and Live Games Manager
8	**Διαφήμιση**	**43,13 days**	**Thu 20/2/25**	**Sun 13/4/25**	**6**	**Quality Manager**
9	Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Communication and Draws Manager;Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη)
10	Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	0,5 days	Mon 7/4/25	Mon 7/4/25	6	Γραφίστας;Marketing and Live Games Manager
11	Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	2 days	Mon 7/4/25	Tue 8/4/25	10SS	
12	Μοίρασμα Φυλλαδίων	1 day	Tue 8/4/25	Tue 8/4/25	10	Διανομέας Φυλλαδίων;Φυλλάδια[1 Τεμάχια]
13	Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	10,13 days	Tue 8/4/25	Sun 13/4/25	11SS	
14	**Εφοδιαστική Υποστήριξη**	**53,13 days?**	**Mon 10/2/25**	**Tue 15/4/25**	**4**	
15	Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	5 days?	Mon 10/2/25	Fri 14/2/25	4	Project Manager
16	Απόκτηση Εξοπλισμού	1 day?	Mon 7/4/25	Mon 7/4/25	15	Project Manager
17	Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	2 days?	Mon 7/4/25	Tue 8/4/25	16SS	Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού;Ηχεία[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια];Ρολόγια[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Τραπέζια[1 Τεμάχια];Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
18	Οργάνωση Ασφάλειας	1 day?	Tue 8/4/25	Tue 8/4/25	15	Ιατρός
19	Ποιοτικός Έλεγχος	11,13 days?	Wed 9/4/25	Tue 15/4/25	17	
20	Διορθωτικές Ενέργειες	12 days?	Tue 8/4/25	Mon 14/4/25	15	
21	**Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών**	**37,13 days**	**Fri 28/2/25**	**Sun 13/4/25**		**Communication and Draws Manager**
22	Δημιουργία προκήρυξης και Φόρμα Εγγραφής	1 day	Fri 28/2/25	Fri 28/2/25	15	Project Manager
23	Υποστήριξη και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες	1,81 mons	Mon 3/3/25	Sun 13/4/25	22	
24	Ορισμός Διαιτητών	1 wk	Mon 24/3/25	Fri 28/3/25	22	Διαιτητές
25	Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	1 day	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	22	Project Manager
26	Πραγματοποίηση Κληρώσεων Αγώνων	1 day	Tue 8/4/25	Tue 8/4/25	22	Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
27	**Διεξαγωγή Τουρνουά**	**9,38 days**	**Wed 9/4/25**	**Sun 13/4/25**	**2;21SS**	**Project Manager;Marketing and Live Games Manager**
28	Τελετή Έναρξης	1 hr	Wed 9/4/25	Wed 9/4/25	26	Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη);Εκφωνητής;Ηχεία[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια]
29	Διεξαγωγή Παρτίδων	9,13 days	Wed 9/4/25	Sun 13/4/25	28	Διαιτητές;Ρολόγια[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Τραπέζια[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια]
30	Μετάδοση Live Παρτίδων	9,13 days	Wed 9/4/25	Sun 13/4/25	29SS	Υπολογιστές[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια];Ρολόγια[1 Τεμάχια];Τραπέζια[1 Τεμάχια]
31	Κατανομή αποτελεσμάτων και Ανάρτηση Βαθμολογίας	9,13 days	Wed 9/4/25	Sun 13/4/25	30SS	Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
32	Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	1 hr	Sun 13/4/25	Sun 13/4/25	31	Βραβεία[1 Τεμάχια];Εκφωνητής;Ηχεία[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια]
33	**Ενέργειες μετά το τουρνουά**	**3 days**	**Mon 14/4/25**	**Wed 16/4/25**	**27**	
34	Επιστροφή Εξοπλισμού	2 days	Mon 14/4/25	Tue 15/4/25	27;13	Ηχεία[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια];Ρολόγια[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού;Τραπέζια[1 Τεμάχια]
35	Καθαρισμός Χώρου	1 day	Mon 14/4/25	Mon 14/4/25	27	Προσωπικό Καθαριότητας;Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη)
36	Αναπροφοδότηση τουρνουά από τους συμμετέχοντες	1 day	Mon 14/4/25	Mon 14/4/25	27	Quality Manager
37	Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	1 day	Tue 15/4/25	Tue 15/4/25	27	Communication and Draws Manager;Financial Manager;Project Manager
38	Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (ΜΜΕ)	1 day	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	37	Marketing and Live Games Manager;Project Manager;Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
39	Finish	0 days	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	38	

Διάγραμμα Gantt

Διάγραμμα Gantt (**Χωρίς** Ονόματα Task):

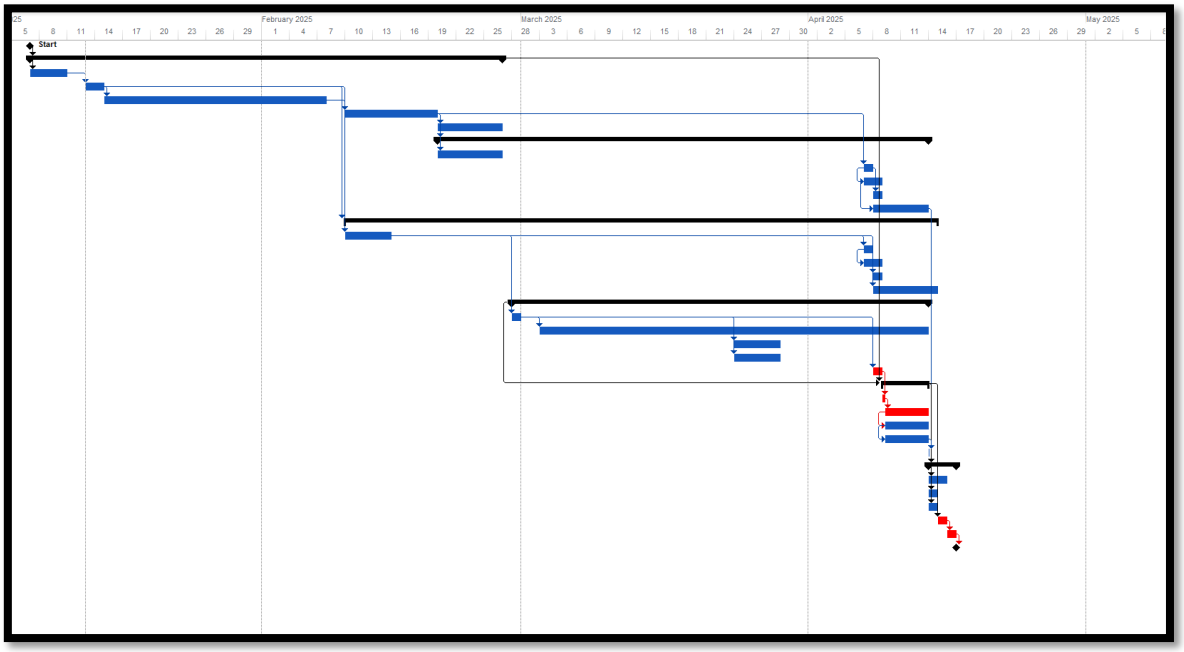

Διάγραμμα Gantt (**Με** Ονόματα Task):

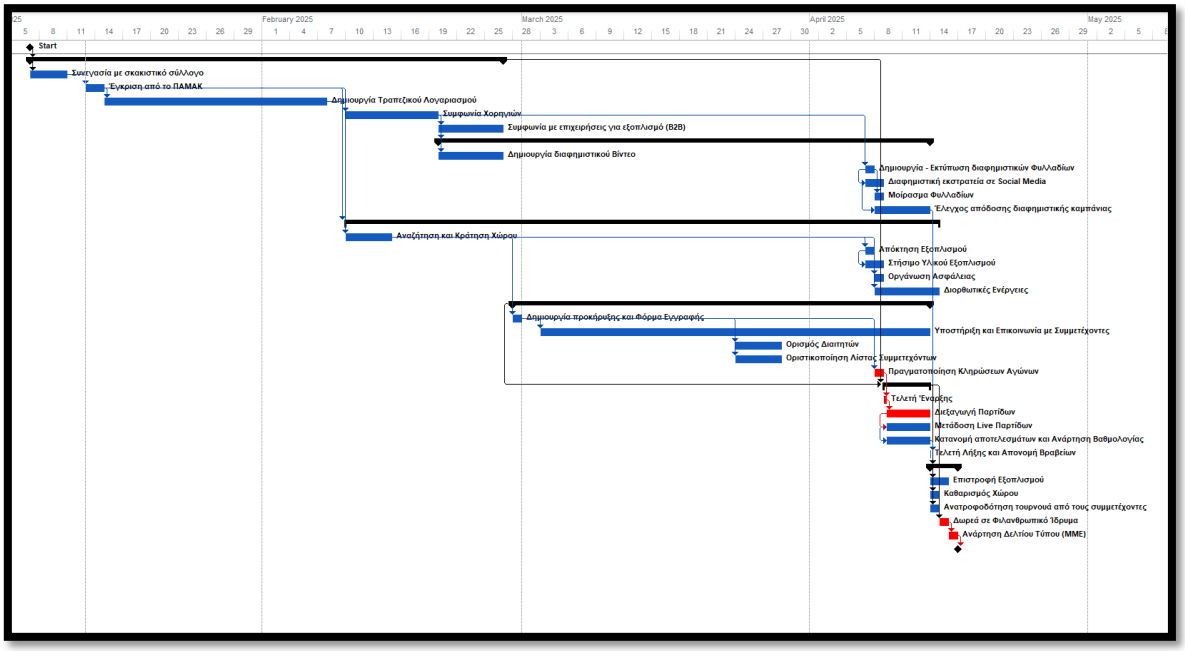

Λίστα Πόρων (Resources Sheet)

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt.	Cost/Use	Accrue At	Base	Code	Add New Column
1	Τραπέζια	Material	Τεμάχια	Τ			7,50 €		0,00 €	Prorated			
2	Βραβεία	Material	Τεμάχια	Β			2,50 €		0,00 €	Prorated			
3	Σκακιέρες	Material	Τεμάχια	Σ			10,00 €		0,00 €	Prorated			
4	Ρολόγια	Material	Τεμάχια	Ρ			5,00 €		0,00 €	Prorated			
5	Καρέκλες	Material	Τεμάχια	Κ			5,00 €		0,00 €	Prorated			
6	Υπολογιστές	Material	Τεμάχια	Υ			25,00 €		0,00 €	Prorated			
7	Ηχεία	Material	Τεμάχια	Η			40,00 €		0,00 €	Prorated			
8	Μικρόφωνο	Material	Τεμάχια	Μ			10,00 €		0,00 €	Prorated			
9	Κονσόλα ήχου	Material	Τεμάχια	Κ			20,00 €		0,00 €	Prorated			
10	Διαιτητές	Work		Δ		500%	8,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
11	Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη)	Cost		Χ						Prorated			
12	Προσωπικό Καθαριότητας	Work		Π		300%	10,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
13	Εκφωνητής	Work		Ε		100%	3,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
14	Project Manager	Work		Ρ		100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
15	Financial Manager	Work		F		100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
16	Marketing and Live Games Manager	Work		Μ		100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
17	Communication and Draws Manager	Work		C		100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
18	Quality Manager	Work		Q		100%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
19	Ιατρός	Work		Ι		100%	15,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
20	Γραφίστας	Work		Γ		100%	7,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
21	Φυλλάδια	Material	Τεμάχια	Φ			0,15 €		0,00 €	Prorated			
22	Αφίσες	Material	Τεμάχια	Α			0,25 €		0,00 €	Prorated			
23	Διανομέας Φυλλαδίων	Work		Δ		100%	4,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		
24	Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού	Work		Σ		100%	15,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Calendar		

Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Πίνακας Ανάθεσης Ευθυνών	Project Manager	Financial Manager	Quality Manager	Communication & Draws Manager	Marketing & Live Games Manager
1.0 Συνεργασίες και Συμφωνίες	I	R / A			
1.1 Συνεργασία με σκακιστικό Σύλλογο	A	I		R	
1.2 Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	A	I		R	
1.3 Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	I	R / A			
1.4 Συμφωνία Χορηγιών	I	A		R	
1.5 Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	A	C		R	
2.0 Διαφήμιση	I				R / A
2.1 Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	I				R / A
2.2 Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	I				R / A
2.3 Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	I				R / A
2.4 Μοίρασμα Φυλλαδίων	I				R / A
2.5 Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	I		R		A
3.0 Εφοδιαστική Υποστήριξη	I	C	R / A		
3.1 Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	A		C	R	
3.2 Απόκτηση Εξοπλισμού	I	I	R / A		
3.3 Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	I		R / A		
3.4 Οργάνωση Ασφάλειας	I		R / A		
3.5 Ποιοτικός Έλεγχος	I		R / A		
3.6 Διορθωτικές Ενέργειες	A		R		
4.0 Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	I			R / A	
4.1 Δημιουργία προκήρυξης και φόρμας εγγραφής	I	C		C	R / A
4.2 Υποστήριξη και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες	I			R / A	
4.3 Ορισμός Διαιτητών	A			R	
4.4 Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	A			R	
4.5 Πραγματοποίηση Κληρώσεων Αγώνων	I			R / A	
5.0 Διεξαγωγή Τουρνουά	R / A		C		C
5.1 Τελετή Έναρξης	R / A			C	I
5.2 Διεξαγωγή Παρτίδων	R / A			C	
5.3 Μετάδοση Live Παρτίδων	I			C	R / A
5.4 Καταγραφή αποτελεσμάτων και ανάρτηση βαθμολογίας	I			R / A	C
5.5 Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	R / A		C	C	C
6.0 Ενέργειες Μετά το Τουρνουά	R / A	C	C	C	C
6.1 Επιστροφή Εξοπλισμού	I		R / A		
6.2 Καθαρισμός Χώρου	I		R / A	C	
6.3 Ανατροφοδότηση τουρνουά από τους συμμετέχοντες	I		A	R	
6.4 Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	R / A	C		I	
6.5 Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (MME)	I	C	C	A	R

R	Responsible — Person working on activity
A	Accountable — Person with decision authority
C	Consult — Key stakeholder who should be included in decision or work activity
I	Inform — Needs to know of decision or action

Μεταβλητά κόστη ανά πόρο, Δ και ΠΕ

	Resource Name	Std. Rate
1	Τραπέζια	7,50 €
2	Βραβεία	2,50 €
3	Σκακιέρες	10,00 €
4	Ρολόγια	5,00 €
5	Καρέκλες	5,00 €
6	Υπολογιστές	25,00 €
7	Ηχεία	40,00 €
8	Μικρόφωνο	10,00 €
9	Κονσόλα ήχου	20,00 €
10	Διαιτητές	8,00 €/hr
11	Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη)	
12	Προσωπικό Καθαριότητας	10,00 €/hr
13	Εκφωνητής	3,00 €/hr
14	Project Manager	0,00 €/hr
15	Financial Manager	0,00 €/hr
16	Marketing and Live Games Manager	0,00 €/hr
17	Communication and Draws Manager	0,00 €/hr
18	Quality Manager	0,00 €/hr
19	Ιατρός	15,00 €/hr
20	Γραφίστας	7,00 €/hr
21	Φυλλάδια	0,15 €
22	Αφίσες	0,25 €
23	Διανομέας Φυλλαδίων	4,00 €/hr
24	Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού	15,00 €/hr

	Task Name	Cost
1	Start	0,00 €
2	**Συμφωνίες και Συνεργασίες**	**15,00 €**
3	Συνεργασία με σκακιστικό σύλλογο	15,00 €
4	Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	0,00 €
5	Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	0,00 €
6	Συμφωνία Χορηγών	0,00 €
7	Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	0,00 €
8	**Διαφήμιση**	**138,15 €**
9	Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	0,00 €
10	Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	71,00 €
11	Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	20,00 €
12	Μοίρασμα Φυλλαδίων	47,15 €
13	Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	0,00 €
14	**Εφοδιαστική Υποστήριξη**	**547,50 €**
15	Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	30,00 €
16	Απόκτηση Εξοπλισμού	20,00 €
17	Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	362,50 €
18	Οργάνωση Ασφάλειας	135,00 €
19	Διορθωτικές Ενέργειες	0,00 €
20	**Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών**	**345,00 €**
21	Δημιουργία προκήρυξης και Φόρμα Εγγραφής	0,00 €
22	Υποστήριξη και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες	0,00 €
23	Ορισμός Διαιτητών	320,00 €
24	Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	0,00 €
25	Πραγματοποίηση Κληρώσεων Αγώνων	25,00 €
26	**Διεξαγωγή Τουρνουά**	**837,50 €**
27	Τελετή Έναρξης	73,00 €
28	Διεξαγωγή Παρτίδων	611,50 €
29	Μετάδοση Live Παρτίδων	52,50 €
30	Κατανομή αποτελεσμάτων και Ανάρτηση Βαθμολογίας	25,00 €
31	Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	75,50 €
32	**Ενέργειες μετά το τουρνουά**	**462,50 €**
33	Επιστροφή Εξοπλισμού	337,50 €
34	Καθαρισμός Χώρου	100,00 €
35	Ανατροφοδότηση τουρνουά από τους συμμετέχοντες	0,00 €
36	Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	0,00 €
37	Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (ΜΜΕ)	25,00 €
38	Finish	0,00 €

Σταθερά κόστη ανά πόρο, Δ και ΠΕ

	Resource Name	Cost/Use
1	Τραπέζια	0,00 €
2	Βραβεία	0,00 €
3	Σκακιέρες	0,00 €
4	Ρολόγια	0,00 €
5	Καρέκλες	0,00 €
6	Υπολογιστές	0,00 €
7	Ηχεία	0,00 €
8	Μικρόφωνο	0,00 €
9	Κονσόλα ήχου	0,00 €
10	Διαιτητές	0,00 €
11	Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη)	
12	Προσωπικό Καθαριότητας	20,00 €
13	Εκφωνητής	0,00 €
14	Project Manager	0,00 €
15	Financial Manager	0,00 €
16	Marketing and Live Games Manager	0,00 €
17	Communication and Draws Manager	0,00 €
18	Quality Manager	0,00 €
19	Ιατρός	15,00 €
20	Γραφίστας	0,00 €
21	Φυλλάδια	0,00 €
22	Αφίσες	0,00 €
23	Διανομέας Φυλλαδίων	0,00 €
24	Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού	0,00 €

	Task Name	Fixed Cost
1	Start	0,00 €
2	**Συμφωνίες και Συνεργασίες**	**0,00 €**
3	Συνεργασία με σκακιστικό σύλλογο	15,00 €
4	Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	0,00 €
5	Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	0,00 €
6	Συμφωνία Χορηγιών	0,00 €
7	Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	0,00 €
8	**Διαφήμιση**	**0,00 €**
9	Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	0,00 €
10	Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	15,00 €
11	Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	20,00 €
12	Μοίρασμα Φυλλαδίων	15,00 €
13	Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	0,00 €
14	**Εφοδιαστική Υποστήριξη**	**0,00 €**
15	Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	30,00 €
16	Απόκτηση Εξοπλισμού	20,00 €
17	Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	0,00 €
18	Οργάνωση Ασφάλειας	0,00 €
19	Διορθωτικές Ενέργειες	0,00 €
20	**Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών**	**0,00 €**
21	Δημιουργία προκήρυξης και Φόρμα Εγγραφής	0,00 €
22	Υποστήριξη και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες	0,00 €
23	Ορισμός Διαιτητών	0,00 €
24	Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	0,00 €
25	Πραγματοποίηση Κληρώσεων Αγώνων	0,00 €
26	**Διεξαγωγή Τουρνουά**	**0,00 €**
27	Τελετή Έναρξης	0,00 €
28	Διεξαγωγή Παρτίδων	0,00 €
29	Μετάδοση Live Παρτίδων	0,00 €
30	Κατανομή αποτελεσμάτων και Ανάρτηση Βαθμολογίας	0,00 €
31	Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	0,00 €
32	**Ενέργειες μετά το τουρνουά**	**0,00 €**
33	Επιστροφή Εξοπλισμού	0,00 €
34	Καθαρισμός Χώρου	0,00 €
35	Αναπροφοδότηση τουρνουά από τους συμμετέχοντες	0,00 €
36	Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	0,00 €
37	Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (ΜΜΕ)	0,00 €
38	Finish	0,00 €

Συνολικό κόστος έργου (μεταβλητό και σταθερό)

Start	0,00 €	0,00 €
Συνεργασία με σκακιστικό σύλλογο	15,00 €	15,00 €
Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	0,00 €	0,00 €
Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	0,00 €	0,00 €
Συμφωνία Χορηγιών	0,00 €	0,00 €
Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	0,00 €	0,00 €
Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	0,00 €	0,00 €
Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	15,00 €	71,00 €
Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	20,00 €	20,00 €
Μοίρασμα Φυλλαδίων	15,00 €	47,15 €
Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	0,00 €	0,00 €
Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	30,00 €	30,00 €
Απόκτηση Εξοπλισμού	20,00 €	20,00 €
Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	0,00 €	362,50 €
Οργάνωση Ασφάλειας	0,00 €	135,00 €
Διορθωτικές Ενέργειες	0,00 €	0,00 €
Δημιουργία προκήρυξης και Φόρμα Εγγραφής	0,00 €	0,00 €
Υποστήριξη και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες	0,00 €	0,00 €
Ορισμός Διαιτητών	0,00 €	320,00 €
Οριστικοποίηση Λίστας Συμμετεχόντων	0,00 €	0,00 €
Πραγματοποίηση Κληρώσεων Αγώνων	0,00 €	25,00 €
Τελετή Έναρξης	0,00 €	73,00 €
Διεξαγωγή Παρτίδων	0,00 €	611,50 €
Μετάδοση Live Παρτίδων	0,00 €	52,50 €
Κατανομή αποτελεσμάτων και Ανάρτηση Βαθμολογίας	0,00 €	25,00 €
Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	0,00 €	75,50 €
Επιστροφή Εξοπλισμού	0,00 €	337,50 €
Καθαρισμός Χώρου	0,00 €	100,00 €
Ανατροφοδότηση τουρνουά από τους συμμετέχοντες	0,00 €	0,00 €
Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	0,00 €	0,00 €
Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (MME)	0,00 €	25,00 €
Finish	0,00 €	0,00 €



Name	Cost
Start	0,00 €
Συμφωνίες και Συνεργασίες	15,00 €
Διαφήμιση	138,15 €
Εφοδιαστική Υποστήριξη	547,50 €
Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών	345,00 €
Διεξαγωγή Τουρνουά	837,50 €
Ενέργειες μετά το τουρνουά	462,50 €


Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών και κινδύνων (1ο Μέρος)


Αλλαγές:


Για τη πραγματοποίηση αλλαγής στο υπάρχον project όποιος θεωρεί ότι η αλλαγή του μπορεί να διευκολύνει την περάτωση του έργου, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Αιτήματος Αλλαγής (CRF) που θα βρει σε σύνδεσμο σε Google Forms. Έπειτα αφού ο PM θεωρεί ότι η αλλαγή είναι άξια προσοχής, την υποβάλλει στο Συμβούλιο Ελέγχου Αλλαγών το οποίο αποφασίζει για την πραγματοποίησή της ή όχι. Εφόσον το συμβούλιο την εγκρίνει, ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς/τμήματα σχετικά με τις νέες συνθήκες και η αλλαγή γίνεται μέρος του έργου.


Φόρμα προσθήκης αλλαγών:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekY8E2n2QVpjJ7k_FrvEFEt_QHVNMWyfa6zKjCzzqr0l7hYA/viewform?usp=sharing







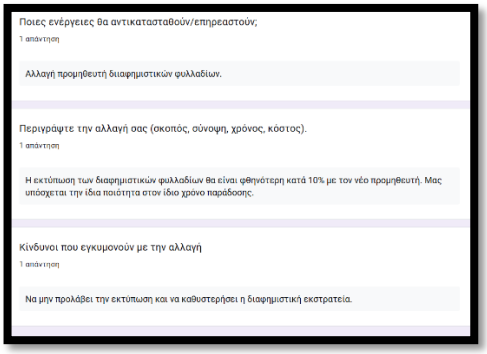

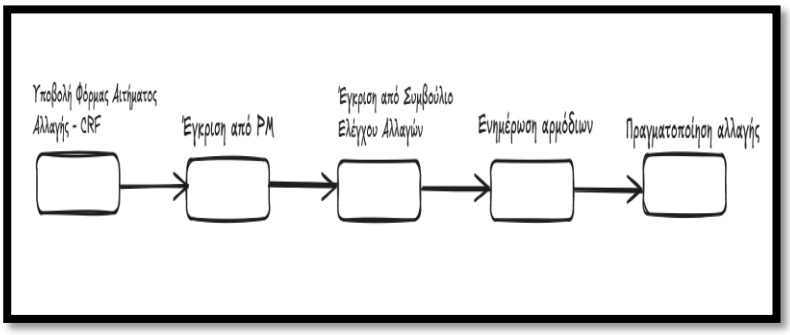

Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών και κινδύνων (2ο Μέρος)

Risk Management Plan

Project Name: 1st International College Chess Tournament of UOM

Project Manager: Παλύζος Βασίλειος

Probability:	Impact:	Priority Score = Probability Score X Impact Score
5 > 75%	5 = Critical	
4 > 50%	4 = Severe	High Priority Score (Red) = Response Plan Required
3 > 25%	3 = Major	Medium Priority Score (Yellow) = Response Plan as needed
2 > 10%	2 = Moderate	Low Priority Score (Green) - Response Plan optional
1 > 0%	1 = Minor	

	Who	When	What				Who	What	When	How	Other
#	Who Identified	Date Identified	Risk Description	Propability	Impact	Priority Score	Owner	Response Type	Due Date	Response Plan	Comments/Status
1	Quality Manager	07/04/2025	Βλάβη στα σκακιστικά ρολόγια	4	4	16	Quality Manager	Έλεγχος	07/04 - 13/04	Άμεση αντικατάσταση των ρολογιών	Επιλυμένος
2	Marketing Manager	12/03/2025	Προβλήματα με την αναμετάδοση των αγώνων	2	2	4	Marketing Manager	Αποδοχή	09/04 - 13/04	Προσπάθεια αποκατάστασης σύνδεσης	Ανοικτός
3	Financial Manager	14/01/2025	Ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις με χορηγούς και επιχειρίσεις	4	5	20	Financial Manager	Αποφυγή	14/01 - 14/02	Παράταση του χρονοδιαγράμματος αν δεν επιτευχθούν επιθυμητές συμφωνίες	Σε Εξέλιξη
4	Project Manager	30/03/2025	Διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ συμμετοχόντων	1	3	3	Communication Manager	Μεταβίβαση	09/04 - 13/04	Τήρηση του κανονισμού της FIDE και εμπλοκή των M.A.T	Ανοικτός
5	Communication Manager	22/03/2025	Ανεπαρκές προσωπικό (πχ. διαιτητών)	3	3	9	Project Manager	Αποφυγή	23/03 - 06/04	Προσέγγιση με πολλούς υποψήφιους συνεργάτες	Επιλυμένος
6	Project Manager	16/02/2025	Χαμηλή προσέλευση συμμετοχόντων	5	5	25	Marketing Manager	Έλεγχος	25/02 - 06/04	εντατική προβολή του τουρνουά μέσω διαφημιστικής καμπάνιας	Κλιμακούμενος
7	Project Manager	17/03/2025	Δυσκολία πρόσβασης των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων	1	2	2	Project Manager	Έλεγχος	09/04- 13/04	Ελεύθερη πρόσβαση σε πάρκινγκ σε απόσταση 50m από τον χώρο αγώνων	Επιλυμένος

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και η διαδικασία επίλυσής τους


Προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε:

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Μη επαρκής χρηματοδότηση από χορηγούς	Εκστρατεία crowdfunding για την εύρεση χορηγών
Έλλειψη υλικού εξοπλισμού	Συμφωνία με επιχειρήσεις για την ενοικίαση σκακιέρων και ρολογιών κατά την διάρκεια του τουρνουά
Μικρή προσέλευση συμμετεχόντων	Ενίσχυση διαφημιστικής εκστρατείας μέσω επιπλέον χρηματοδότησης στα social media για την προώθηση των διαφημιστικών καμπανιών για το τουρνουά

Σχεδιασμός και αντιμετώπιση ανεπάρκειας πόρων (Παράδειγμα 1ο)


Πριν την Εξομάλυνση Πόρων:

7		Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Marketin
8		**Διαφήμιση**	**43,13 days**	**Thu 20/2/25**	**Sun 13/4/25**	**6**	**Quality**
9		Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Commun
10		Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	0,5 days	Mon 7/4/25	Mon 7/4/25	6	Γραφίστ
11		Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	2 days	Mon 7/4/25	Tue 8/4/25	10SS	Marketin
12		Μοίρασμα Φυλλαδίων	1 day	Tue 8/4/25	Tue 8/4/25	10	Διανομέ
13		Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	10,13 days	Tue 8/4/25	Sun 13/4/25	11SS	
14		**Εφοδιαστική Υποστήριξη**	**53 days?**	**Mon 10/2/25**	**Mon 14/4/25**	**4**	

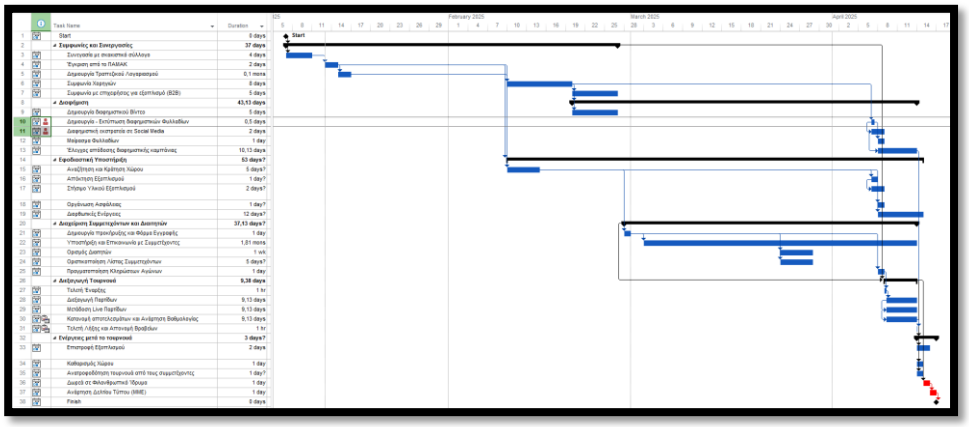

Μετά την Εξομάλυνση Πόρων:


7		Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Marketin
8		**Διαφήμιση**	**43,88 days**	**Thu 20/2/25**	**Sun 13/4/25**	**6**	**Quality**
9		Δημιουργία διαφημιστικού Βίντεο	5 days	Thu 20/2/25	Wed 26/2/25	6	Commun
10		Δημιουργία - Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων	0,5 days	Mon 7/4/25	Mon 7/4/25	6	Γραφίστ
11		Διαφημιστική εκστρατεία σε Social Media	2 days	Mon 7/4/25	Sun 13/4/25	10SS	Marketin
12		Μοίρασμα Φυλλαδίων	1 day	Tue 8/4/25	Tue 8/4/25	10	Διανομέ
13		Έλεγχος απόδοσης διαφημιστικής καμπάνιας	10,13 days	Tue 8/4/25	Sun 13/4/25	11SS	
14		**Εφοδιαστική Υποστήριξη**	**53 days?**	**Mon 10/2/25**	**Mon 14/4/25**	**4**	

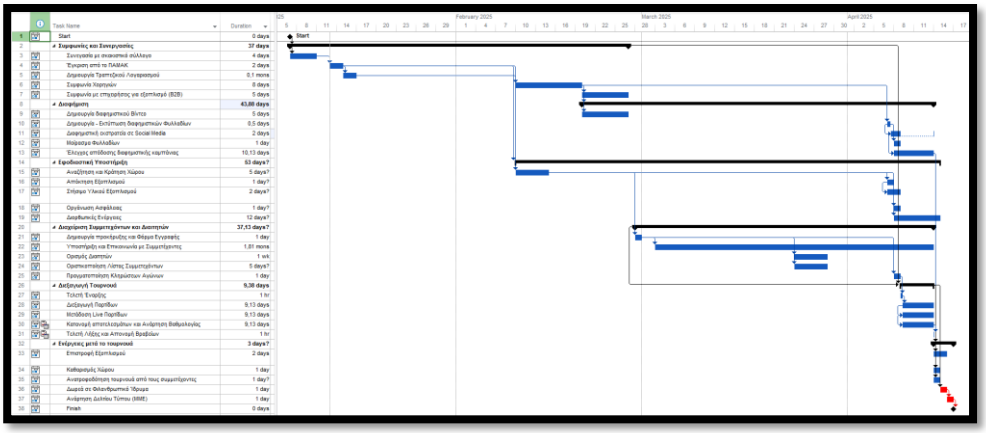

Σχεδιασμός και αντιμετώπιση ανεπάρκειας πόρων (Παράδειγμα 2ο)


Πριν την Εξομάλυνση Πόρων:

31	Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	1 hr	Sun 13/4/25	Sun 13/4/25	30	Βραβεία[1 Τεμάχια];Εκφωνητής;Ηχεία[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια]
32	**Ενέργειες μετά το τουρνουά**	**3 days?**	**Mon 14/4/25**	**Wed 16/4/25**	**26**	
33	Επιστροφή Εξοπλισμού	2 days	Mon 14/4/25	Tue 15/4/25	26;13	Ηχεία[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια];Ρολόγια[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού;Τραπέζια[1 Τεμάχια]
34	Καθαρισμός Χώρου	0,5 days	Mon 14/4/25	Mon 14/4/25	26	Προσωπικό Καθαριότητας;Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη);Quality Manager
35	Αναπροσδιόρισμός τουρνουά από τους συμμετέχοντες	1 day?	Mon 14/4/25	Mon 14/4/25	26	Quality Manager
36	Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	1 day	Tue 15/4/25	Tue 15/4/25	26	Communication and Draws Manager;Financial Manager;Project Manager
37	Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (ΜΜΕ)	1 day	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	36	Marketing and Live Games Manager;Project Manager;Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
38	Finish	0 days	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	37	

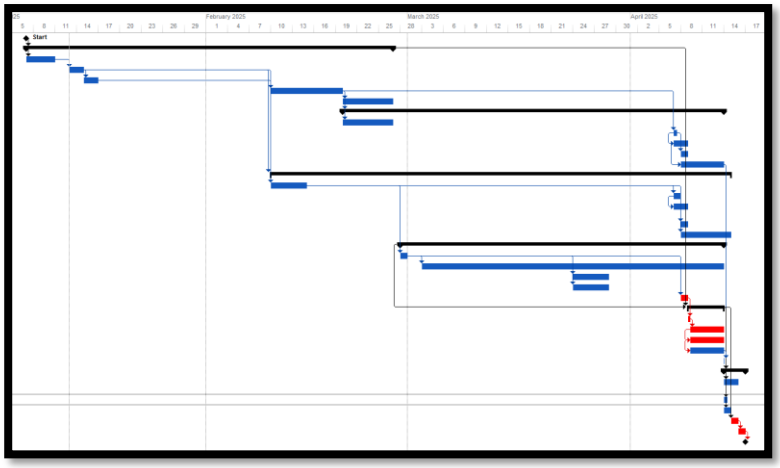

Μετά την Εξομάλυνση Πόρων:

31	Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων	1 hr	Sun 13/4/25	Sun 13/4/25	30	Βραβεία[1 Τεμάχια];Εκφωνητής;Ηχεία[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια]
32	**Ενέργειες μετά το τουρνουά**	**3 days?**	**Mon 14/4/25**	**Wed 16/4/25**	**26**	
33	Επιστροφή Εξοπλισμού	2 days	Mon 14/4/25	Tue 15/4/25	26;13	Ηχεία[1 Τεμάχια];Καρέκλες[1 Τεμάχια];Κονσόλα ήχου[1 Τεμάχια];Μικρόφωνο[1 Τεμάχια];Ρολόγια[1 Τεμάχια];Σκακιέρες[1 Τεμάχια];Συνεργείο μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού;Τραπέζια[1 Τεμάχια]
34	Καθαρισμός Χώρου	1 day	Mon 14/4/25	Tue 15/4/25	26	Προσωπικό Καθαριότητας;Χώρος Διεξαγωγής (Λέσχη);Quality Manager
35	Αναπροσδιόρισμός τουρνουά από τους συμμετέχοντες	1 day?	Mon 14/4/25	Mon 14/4/25	26	Quality Manager
36	Δωρεά σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα	1 day	Tue 15/4/25	Tue 15/4/25	26	Communication and Draws Manager;Financial Manager;Project Manager
37	Ανάρτηση Δελτίου Τύπου (ΜΜΕ)	1 day	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	36	Marketing and Live Games Manager;Project Manager;Υπολογιστές[1 Τεμάχια]
38	Finish	0 days	Wed 16/4/25	Wed 16/4/25	37	

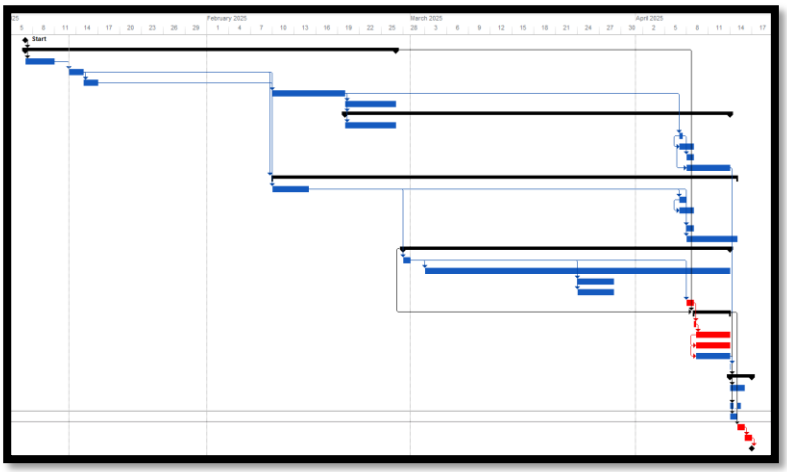

Ατομικά Timesheets (1ο Μέρος)

- Διαχείριση Έργου (Πολύζος Βασίλειος - Project Manager)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1/11/2024	Επιλογή Έργου	**1 ημέρα**
2/11/2024	Ανάθεση Αρμοδιοτήτων	**10 ημέρες**
6/11/2024	Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού	**7 ημέρες**
13/11/2024	Δημιουργία Χάρτη Έργου	**1 ημέρα**
14/11/2024	Έλεγχος Δραστηριοτήτων	**10 ημέρες**
Συνολική Διάρκεια για τον μήνα Νοέμβριο		**29 ημέρες**

- Συνεργασίες και Συμφωνίες (Γιαννουλάκος Βασίλειος – Financial Manager)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07/01/25	Συνεγασία με σκακιστικό σύλλογο	**4 ημέρες**
13/01/25	Έγκριση από το ΠΑΜΑΚ	**2 ημέρες**
15/01/25	Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού	**1 ημέρα**
10/02/25	Συμφωνία Χορηγιών	**8 ημέρες**
20/02/25	Συμφωνία με επιχειρήσεις για εξοπλισμό (B2B)	**5 ημέρες**
Συνολική Διάρκεια για τους 2 πρώτους μήνες του 2025 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)		**20 ημέρες**

Ατομικά Timesheets (2ο Μέρος)

- Διαχείριση Συμμετεχόντων και Διαιτητών (Πολυμεράς Ευάγγελος - Communications and Draws Manager)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
28/02/2025	Δημιουργία προκήρυξης και φόρμας εγγραφής	**1 ημέρα**
03/03/2025	Υποστήριξη και επικοινωνία με συμμετέχοντες	**42 ημέρες**
24/03/2025	Ορισμός Διαιτητών	**5 ημέρες**
31/03/2025	Οριστικοποίησης Λίστας Συμμετεχόντων	**1 ημέρα**
08/04/2025	Πραγματοποίηση κληρώσεων αγώνων	**5 ημέρες**
Συνολική Διάρκεια για 3 μήνες (Φεβρουάριος – Απρίλιος)		**54 ημέρες**

- Ενέργειες μετά το τουρνουά (Παναγιώτης Σαμαράς - Marketing and Live Games Manager)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13/4/2025	Επιστροφή εξοπλισμού	**2 ημέρες**
14/4/2025	Καθαρισμός χώρου	**1 ημέρα**
14/4/2025	Δημιουργία ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης από τους διαγωνιζόμενους	**1 ημέρα**
15/4/2025	Αποστολή ερωτηματολογίου και συλλογή δεδομένων	**7 ημέρες**
15/4/2025	Δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα	**1 ημέρα**
16/4/2025	Δημιουργία/Ανάρτηση δελτίου τύπου	**1 ημέρα**
Συνολική Διάρκεια για τον Απρίλιο		**20 ημέρες**

Ατομικά Timesheets (3ο Μέρος)

- Εφοδιαστική Υποστήριξη (Μηλίκος Ευαγγέλος - Quality Manager)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10/2/2025	Αναζήτηση και Κράτηση Χώρου	**5 ημέρες**
7/4/2025	Απόκτηση Εξοπλισμού	**1 ημέρα**
7/4/2025	Στήσιμο Υλικού Εξοπλισμού	**2 ημέρες**
8/4/2025	Οργάνωση Ασφάλειας	**1 ημέρα**
9/4/2025	Ποιοτικός Έλεγχος	**12 ημέρες**
8/4/2025	Διορθωτικές Ενέργειες	**12 ημέρες**
Συνολική Διάρκεια για 3 μήνες (Φεβρουάριος – Απρίλιος)		**33 ημέρες**

Πηγές

- **https://intropm2.com/wp-content/uploads/2017/09/6e-ch-1-sep-6-2017.pdf** (*An Introduction to Project Management, Sixth Edition With a Brief Guide to Microsoft Project Professional 2016*)
- **https://openeclass.uom.gr/modules/document/index.php?course=DAI138&openDir=/621cab45YRBQ** (*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛ0523) | ΠΑ.ΜΑΚ. - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ*)
- **https://www.chesskavala.gr/open/wp-content/uploads/2020/03/kavala-open-2024-gre.pdf** *(33 ΟΠΕΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ*)
- **https://www.workamajig.com/blog/work-breakdown-structures-wbs** (*UNDERSTANDING THE WORK BREAKDOWN STRUCTURE WBS*)
- **https://www.wrike.com/blog/what-is-an-action-plan-with-example** (*What is an action plan?*)
- **Εισαγωγή στην Διοίκηση Έργων** (*Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD*)

